
BIBLE QUEST

KZANN TECH

Etapa 1 — Backup, Estabilização e Publicação

Versão: 0.16.2 (auditada: 0.16.1) **Data: 14/11/2026**

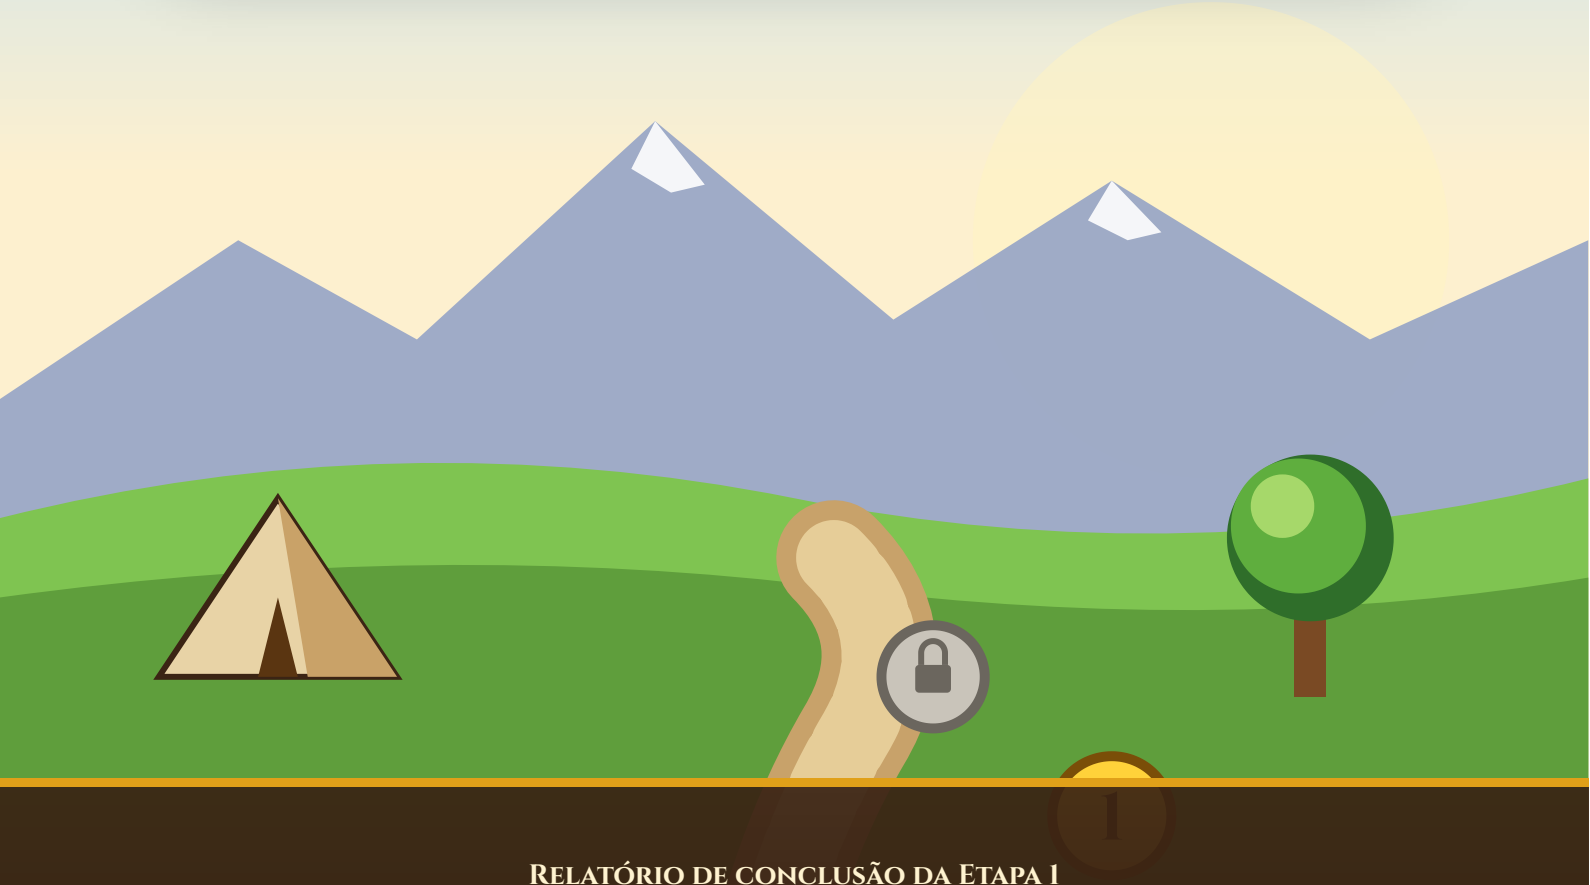

Relatório de conclusão da Etapa 1

Documento técnico · uso interno do projeto

Índice

1. Situação inicial 2
2. Arquivos modificados 3
3. Commits e tags 3
4. Alterações no workflow 4
5. Resultados dos testes 4
6. Resultado do build 5
7. Situação da publicação 6
8. Problemas restantes 6
9. Critérios de aceitação 7

Resumo da etapa

4	0	144	0
publicações seguidas pelo `main` com sucesso	publicações canceladas depois da correção	testes passando, com build e tipos sem erro	mudanças no jogo (arquivos idênticos aos auditados)

Resultado: Etapa 1 concluída. A publicação foi corrigida e comprovada com publicações seguidas pelo ramo de produção (`main`): execuções 45, 46, 48 e 50. O ponto de retorno `v0.16.1` está confirmado no GitHub e aponta para o commit auditado `5a1a21f`. Os sete critérios de aceitação foram atendidos com evidência (seção 9).

> Nenhum personagem, mapa, pergunta ou conteúdo bíblico foi alterado. As únicas mudanças são o workflow de publicação, a documentação e o número da versão.

1. Situação inicial

Git

- Árvore de trabalho limpa: nenhuma alteração local sem commit.
- `HEAD`, `origin/main` e `origin/claude/loving-carson-8mrbjo` no mesmo commit: `5a1a21f` ("Auditoria geral e plano oficial de evolução (v0.16.1)").
- `package.json` na versão 0.16.1. O commit só acrescentou documentação ao estado auditado (7 arquivos, nenhum em `src/`).
- Nenhuma tag existia, nem local nem no GitHub.

Publicação (antes da correção)

Evidências: lista de execuções do GitHub Actions e histórico de implantações do ambiente `github-pages` (API pública de deployments).

Execução	Ramo	Versão	Resultado	Causa
37, 39, 41	`main`	0.14.0, 0.15.0, 0.16.0	FALHA	Build concluído; publicação recusada pelo ambiente (estado "waiting" → "failure" em 2 s, sem executar passos). O ambiente só aceitava os ramos `claude/...`
38 (1ª tentativa), 40	`claude/loving-carson-8mrbjo`	0.15.0, 0.16.0	CANCELADA	Grupo único `pages` com `cancel-in-progress: true`: o envio ao `main`, logo depois, cancelou a publicação válida
42	`main`	0.16.1	CANCELADA	Cancelada pela execução 43 (mesmo grupo)
43	`claude/loving-carson-8mrbjo`	0.16.1	PUBLICADA	Implantação com sucesso às 15:54 (UTC)

Correção de uma informação anterior

A versão 0.16.0 **nunca foi publicada sozinha**: entre 15:25 e 15:54 (UTC) o site continuou na 0.15.0. Na época foi informado que ela estava no ar. A conferência procurou o texto `av-cena` no JavaScript publicado, mas esse texto já existia na 0.15 (classe do cenário do mapa, em `Cena.tsx`), e o resultado foi um falso positivo. A partir desta etapa, a conferência compara o nome exato do arquivo publicado com o do build do mesmo commit, junto com o registro da implantação.

Diferença entre build concluído e publicação efetiva

"Build concluído" só quer dizer que `dist/` foi gerado e enviado como artefato. A publicação efetiva exige três coisas: o job de publicação terminar com sucesso, a implantação ficar em `success` e o site passar a servir os arquivos novos. Antes da correção, o `main` chegava só à primeira parte.

2. Arquivos modificados

ARQUIVO	MUDANÇA
`.github/workflows/deploy.yml`	Nova estratégia de verificação e publicação (seção 4)
`docs/planos/PUBLICACAO-E-BACKUP.md` (novo)	Ponto de retorno, histórico da falha, estratégia, processo de publicação, verificação e limitações
`docs/README.md`	Índice da documentação com o novo documento
`README.md`	Seção "Publicação no GitHub Pages" reescrita; histórico de atualizações (0.16.2)
`CHANGELOG.md`	Entrada 0.16.2, com a causa, a correção do falso positivo e a verificação
`ROADMAP.md`	Situação da Etapa 1 e pendência da tag
`package.json`, `package-lock.json`	Versão 0.16.1 → 0.16.2

Nada mudou em `src/`, `public/`, `vite.config.ts` nem `index.html` (conferido com `git diff`).

3. Commits e tags

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Commit auditado	`5a1a21f1e4b386bcdccf9046cc5923e5139dd441`	No `main` e no ramo de desenvolvimento
Tag de retorno	`v0.16.1` (anotada) → `5a1a21f`. Mensagem: "Ponto de retorno: versão 0.16.1 auditada"	CONFIRMADA NO GITHUB
Commit da etapa	`e8bd523`: "Etapa 1: ponto de retorno e publicação estável pelo main (v0.16.2)"	No `main` e no ramo de desenvolvimento
Commit do registro	`adfa4dc`: "Etapa 1: registro da verificação das publicações pelo main (v0.16.2)"	No `main` e no ramo de desenvolvimento
Commit de fechamento	`d5b618f`: "Etapa 1 concluída: tag v0.16.1 confirmada no GitHub (v0.16.2)"	No `main` e no ramo de desenvolvimento

Como a tag chegou ao GitHub: o envio pela sessão (`git push origin refs/tags/v0.16.1`) foi recusado três vezes pela conexão ("the remote end hung up unexpectedly"), porque esta sessão só pode enviar ao seu ramo de trabalho. O dono do projeto criou a tag pelo site em 14/11/2026 às 17:00 (UTC): Releases → tag `v0.16.1`, alvo `5a1a21f`, release "v0.16.1 — versão auditada", pre-release.

Conferência: `git ls-remote --tags origin` mostra `5a1a21f1e4b386bcdccf9046cc5923e5139dd441 refs/tags/v0.16.1`, e a API pública de releases confirma o alvo. A tag do GitHub é do tipo simples; a cópia local, anotada, aponta para o mesmo commit. Nenhuma tag foi sobrescrita e nenhuma alteração local foi descartada.

4. Alterações no workflow

ASPECTO	ANTES	DEPOIS
Quem publica	`main`, `master` e `claude/**` (todos tentavam)	**Só o `main`** (ramo de produção)
Ramos de desenvolvimento	Publicavam	Só verificam: tipos, testes, build e arquivos gerados. Pull requests para o `main` também
Publicação manual	De qualquer ramo	Aceita só no `main`
Concorrência	Grupo único `pages`, `cancel-in-progress: true` em tudo	Verificação: grupo por ramo (cancela só fora do `main`). Publicação: grupo `pages-producao` com `cancel-in-progress: false`
Permissões	`pages: write` e `id-token: write` em todo o workflow	`contents: read` no workflow; `pages` e `id-token` só no job de publicação
Artefato do Pages	Gerado em todo envio	Gerado só no `main`
Conferência	Nenhuma	`dist/index.html`, scripts em `dist/assets/`, modelos `.glb` e caminhos relativos `./assets/`
Configuração no GitHub	Ambiente aceitava só `claude/...`	`main` liberado pelo dono do projeto (14/11/2026)

O funcionamento local não mudou: `npm run dev`, `npm test` e `npm run build` são os mesmos, e `base: './'` foi mantido. A sintaxe do YAML foi conferida localmente com um leitor de YAML, mas o verificador oficial de workflows (actionlint) não pôde ser instalado nesta sessão. A validação real foram as execuções da seção 7.

5. Resultados dos testes

COMANDO	LOCAL	GITHUB ACTIONS
`npm run typecheck`	SEM ERROS	Sucesso nas execuções 44, 45, 46, 47 e 48
`npm test`	144 DE 144 em 11 arquivos	Sucesso nas mesmas execuções
`npm run build`	PASSOU	Sucesso nas mesmas execuções

Comportamento do jogo no site publicado

As 23 telas da auditoria foram abertas no site publicado (Chromium, 390 px, perfil de teste) e o resultado foi igual ao da auditoria:

- nenhum erro de JavaScript;
- nenhuma rolagem lateral;
- 3D pronto em 2,7 s;
- os dois modelos `.glb` baixados.

O único aviso foi o do driver de vídeo (“GPU stall due to ReadPixels”). A tela de perguntas continua sem `h1`, um problema já conhecido e fora desta etapa.

6. Resultado do build

- **Arquivos idênticos aos da versão auditada:** `assets/index-CKNufloV.js` (733,6 kB) e `assets/index-DjzVP5wM.css`. O nome contém o resumo do conteúdo, então o código do jogo é o mesmo da 0.16.1.
- `dist/index.html` com caminhos relativos (`./assets/`, `./favicon.svg`, `./manifest.webmanifest`), corretos para a subpasta `/Bible-Quest/`.
- 4 scripts em `dist/assets/` e os modelos `heroi-feminino.glb` e `heroi-masculino.glb` em `dist/models/personagem/`.
- **No site publicado**, todos respondem com status 200:
  - `assets/index-CKNufloV.js` (733.564 bytes);
  - `models/personagem/heroi-masculino.glb` (1.797.488 bytes);
  - `manifest.webmanifest` e `favicon.svg`.

7. Situação da publicação

EXECUÇÃO	GATILHO	COMMIT	VERIFICAÇÃO	PUBLICAÇÃO	IMPLANTAÇÃO	SITE
44	envio a `claude/...`	`e8bd523`	SUCESSO	pulada (previsto)	—	sem mudança
45	envio ao `main`	`e8bd523`	SUCESSO	SUCESSO	7790588720 `success` 16:44:35	`last-modified` 15:54:47 → 16:44:29
46	"Run workflow" no `main`	`e8bd523`	SUCESSO	SUCESSO	7790604371 `success` 16:45:46	`last-modified` 16:45:39
47	envio a `claude/...`	`adfa4dc`	SUCESSO	pulada (previsto)	—	sem mudança
48	envio ao `main`	`adfa4dc`	SUCESSO	SUCESSO	7790650959 (`main`, `adfa4dc`)	`last-modified` 16:49:22
49	envio a `claude/...`	`d5b618f`	SUCESSO	pulada (previsto)	—	sem mudança
50	envio ao `main`	`d5b618f`	SUCESSO	SUCESSO	7790802442 (`main`, `d5b618f`)	`last-modified` 17:01:44

Horários em UTC, em 14/11/2026. As execuções 47 e 48, e depois 49 e 50 (desenvolvimento e produção), rodaram ao mesmo tempo, e **nenhuma foi cancelada**. No esquema antigo, uma cancelaria a outra. Depois de cada publicação, o site serviu `assets/index-CKNufloV.js`, o mesmo arquivo do build do commit publicado.

Ramo oficial de publicação: `main`. **Endereço:** https://theuzxl13-oss.github.io/Bible-Quest/

8. Problemas restantes

PROBLEMA	GRAVIDADE	QUEM RESOLVE
A sessão de desenvolvimento não pode enviar tags: os próximos pontos de retorno também dependem do dono do projeto, pelo site	Baixa	Dono do projeto
Regras antigas dos ramos `claude/...` no ambiente `github-pages` (não foi possível confirmar se foram removidas)	Baixa: o workflow já não publica por elas	Dono do projeto (Settings → Environments)
`main` sem proteção de ramo e sem revisão obrigatória: a aprovação depende de combinação, não de regra do GitHub	Baixa	Possível melhoria futura
Workflow não validado pelo actionlint (ferramenta não instalável nesta sessão)	Baixa: as execuções reais o validaram	—
Problemas do jogo apontados na auditoria (por exemplo, a tela de perguntas sem `h1`)	Conforme a auditoria	Etapas seguintes do roadmap

9. Critérios de aceitação

CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
Ponto de retorno confirmado	ATENDIDO	Tag `v0.16.1` no GitHub → `5a1a21f` (commit auditado), conferida por `git ls-remote` e pela API de releases
Publicação corrigida	ATENDIDO	Causa identificada (ambiente e concorrência); workflow novo; `main` liberado; desenvolvimento não publica (execuções 44 e 47)
Duas publicações consecutivas verificadas	ATENDIDO	Execuções 45 e 46 (e depois 48 e 50), implantações em `success`, `last-modified` atualizado e arquivo servido igual ao do build
Execuções concorrentes sem cancelar publicação válida	ATENDIDO	Execuções 47 e 48, e 49 e 50, simultâneas e todas com sucesso
Testes e build passando	ATENDIDO	144 de 144, tipos e build, local e no Actions
Comportamento do jogo inalterado	ATENDIDO	JS e CSS idênticos aos auditados; 23 telas iguais à auditoria no site publicado
Documentação atualizada	ATENDIDO	`PUBLICACAO-E-BACKUP.md`, README, CHANGELOG, ROADMAP e índice de `docs/`

Conclusão: os sete critérios foram atendidos com evidência, e a **Etapa 1 está concluída**. Nenhuma outra etapa foi iniciada: o projeto aguarda a aprovação do dono para seguir.
